

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2024年7月 NO.47

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで造成工事、非常口ヤード進入路で土工事・^{のりめんこう}法面工を、村道区間①下流側で土工事・^{のりめんこう}法面工、村道区間①上流側で伐採工、村道区間④⑤でパンウォール工を行っています。また、南木曽からの発生土運搬に先立ち、長野県と協力して国道256号の枝払・草刈を行っています。

7月7日の清内路環境整備にJR・機構・清水JV・大林JVも参加しました。




非常口ヤード
造成工事
2024年7月2日




非常口ヤード進入路
土工事
2024年7月9日




村道区間①下流
土工事
2024年7月13日

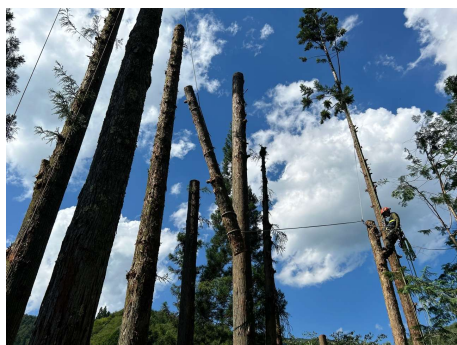

村道区間①上流
伐採工
2024年7月2日

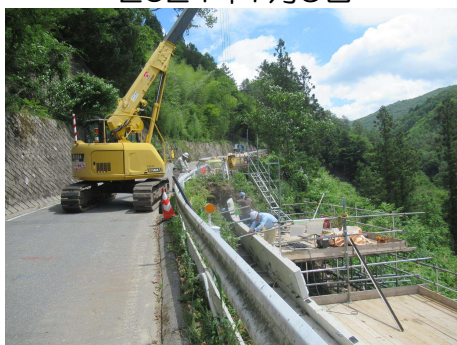

村道区間⑤
パンウォール工_パネル設置
2024年7月9日

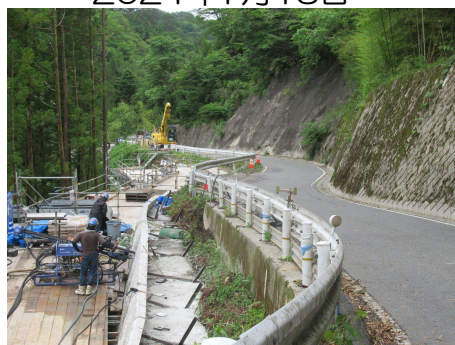

村道区間⑤ さっこう
パンウォール工_削孔
2024年7月2日




国道256号
枝払・草刈
2024年7月5日



清内路環境整備に参加
2024年7月7日



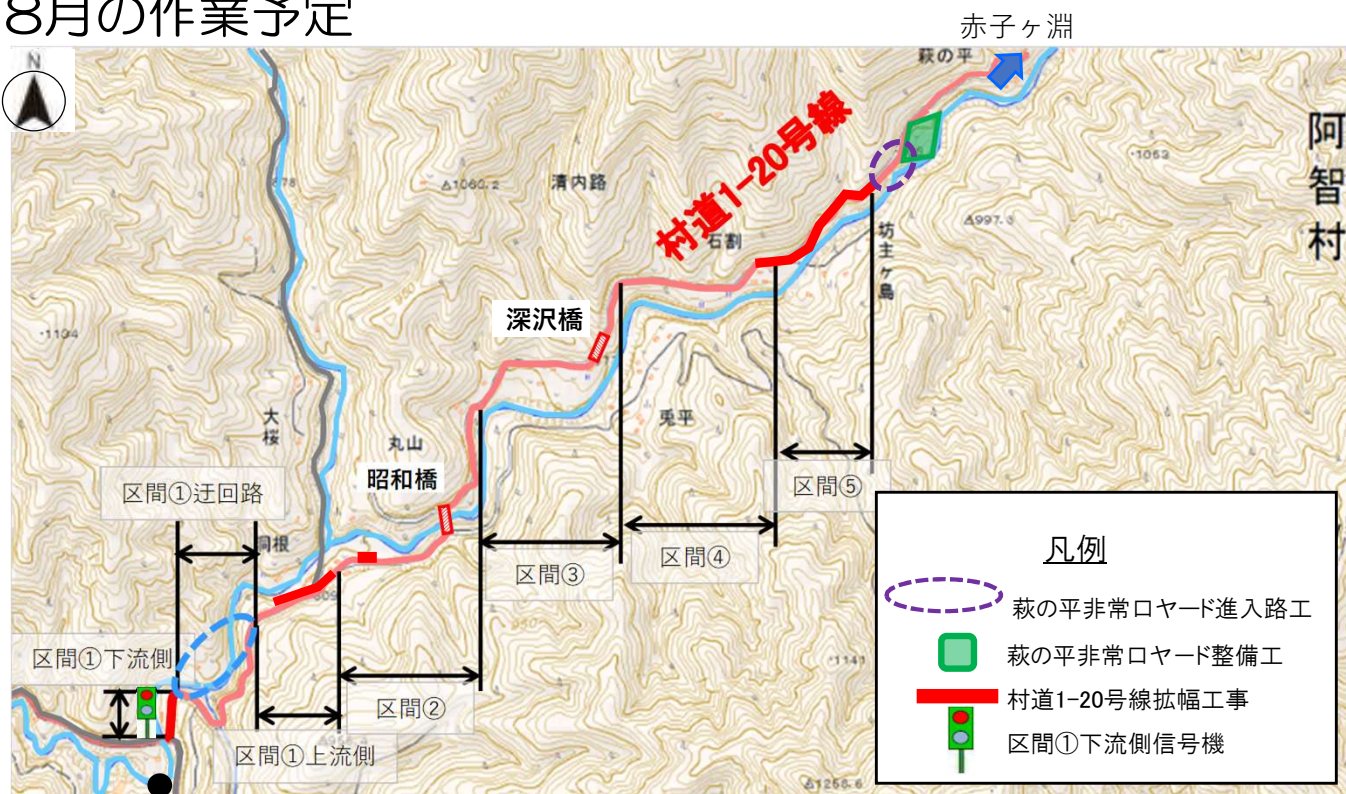

萩の平非常口ヤード造成工事は造成工事、萩の平非常口ヤード進入路工は○に示す箇所で引き続き、切土・法面工・補強盛土工を行います。村道1-20号線拡幅工事は、で示す区間①下流側で基礎工・軽量盛土工、区間①上流側でパンウォール工、区間②で支障移転工事、区間④⑤でパンウォール工をする予定です。側溝清掃等による降雨時の安心確保のための道路清掃を行う予定です。

2024年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
萩の平非常口 ヤード造成工事	造成工事																														
萩の平非常口 ヤード進入路工	土工事(切土、法面工、補強盛土工)																														
村道1-20号線 拡幅工事	【区間①下流側】基礎工、軽量盛土工				夏季休暇																										
	【区間①上流側】バンウォール工																														
	【区間②】支障移転工事																														
	【区間④⑤】バンウォール工																														
	【区間①～⑤】道路清掃																														
資材搬入車両 予定台数	30～60 台/日 (往復)			30～60台/日 (往復)													40～80台/日 (往復)						40～80台/日 (往復)								

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回（往路・復路）通過します。
※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

【工事の監督指導に関すること】

TEL: 0573-67-8690 担当: 菊地, 辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL:0265-48-5736 担当:阿部, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。
清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。
