

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2025年12月 NO.64

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、ヤード造成工、トンネル仮設備工(ずりピット工)、非常口ヤード進入路で壁面工、路床工、村道区間①下流で石積擁壁工、区間②③でガードレール基礎工、路盤工、区間⑤で伐採工、う回路下流側で地盤改良工、既設構造物撤去工、上流側で仮締切工、仮橋工を行っています。



非常口ヤード
ドローン撮影
2025年11月26日



う回路上流側
ドローン撮影
2025年11月26日



う回路上流側
100tクレーン作業状況
2025年12月15日




非常口ヤード
ヤード造成工
2025年12月9日



非常口ヤード
ずりピット工
2025年12月9日



村道区間③
ガードレール基礎工
2025年12月9日

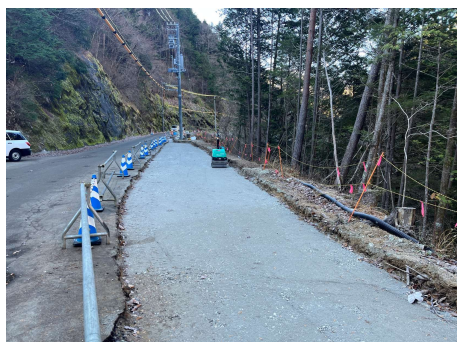

村道区間②
路盤工
2025年12月9日




区間①う回路
仮締切工
2025年12月3日



村道区間①
石積擁壁工
2025年12月4日

1月の工事予定

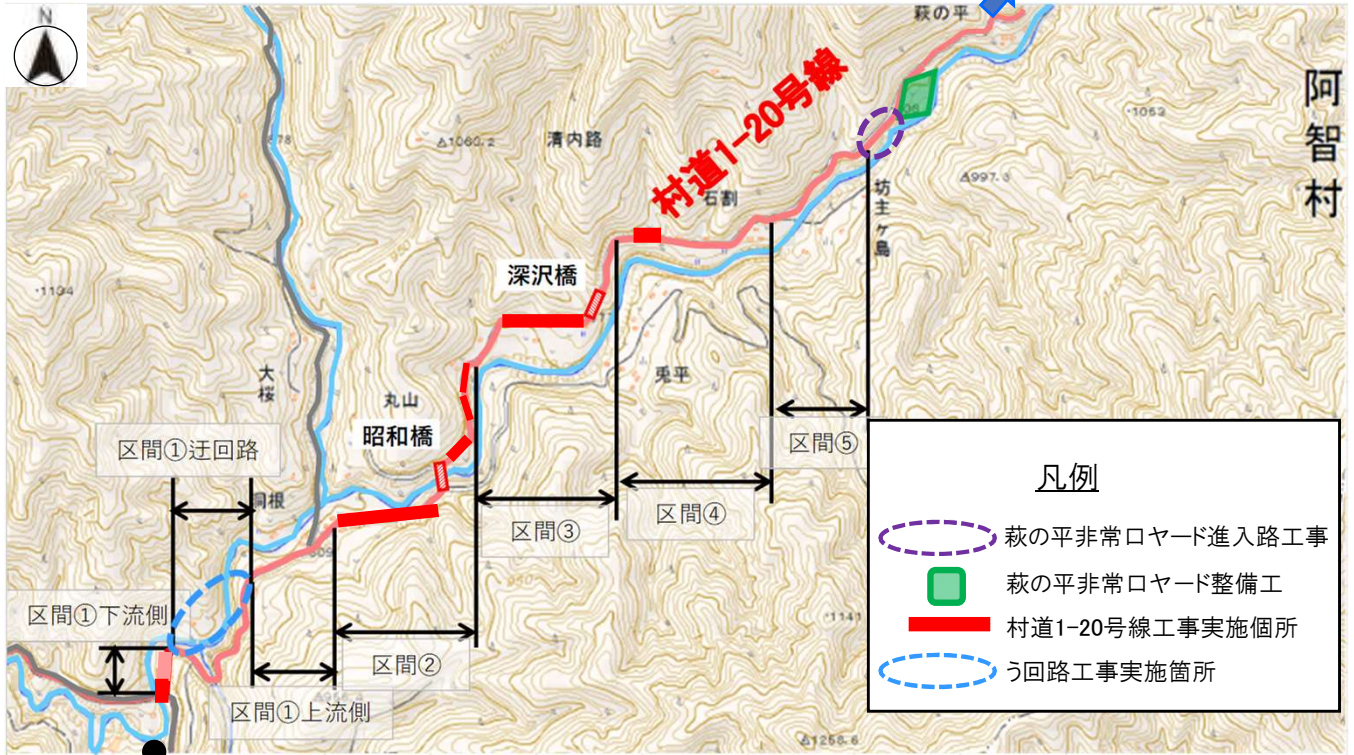

清内路振興室

萩の平非常口ヤード整備工事は法面工、ヤード造成工、トンネル仮設備工は ■ の箇所で行い、萩の平非常口ヤード進入路工事は ○ に示す箇所です。

村道1-20号線拡幅工事は ■ に示す区間①下流側で水道工事、路体盛土、セメント改良、区間②で排水工、盛土、法面整形、ロードプラス工、区間③で路床工、路盤工を、区間④で擁壁工を、○ に示す区間①う回路上流側で仮橋工をする予定です。

※萩の平非常口及び区間①う回路工事においては、引続き残業と土曜日の作業をさせて頂いております。

※12/27 (土) ~ 1/4 (日) まで休工の予定です。

2026年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
萩の平非常口ヤード整備工事					法面工、ヤード造成工、トンネル仮設備工																																
萩の平非常口ヤード進入路工事					路床工、防護柵																																
村道1-20号線拡幅工事	年末年始休暇				【区間①う回路上流】仮橋工																																
					【区間①下流】水道工事、路体盛土、セメント改良																																
					【区間②】排水工、盛土、法面整形、ロードプラス工																																
					【区間③】路床工、路盤工																																
				【区間④】擁壁工																																	
資材搬入車両予定台数					50~200台/日 (往復)				50~200台/日 (往復)				50~200台/日 (往復)				50~200台/日 (往復)																				

※11月の資材搬入車両実績：94台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回(往路・復路)通過します。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

お問い合わせ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL: 0573-67-8690 担当: 若林, 辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL: 0265-48-5736 担当: 齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。
