

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2025年2月 NO.54

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、土工事、非常口ヤード進入路で補強盛土工、村道区間①下流側でガードレール工、路盤工、舗装工、区間①迂回路でヤード造成工、仮栈橋工、村道区間①上流側でパンウォール工、村道区間②で支障移転工事、伐採工、村道区間③でパンウォール工、村道区間④で路盤工、舗装工、ガードレール工を、必要に応じて村道の除雪工を行っています。



非常口ヤード
土工事
2024年12月24日



非常口ヤード
法面工
2025年2月13日



非常口ヤード進入路
補強盛土工
2025年2月13日



村道区間①下流
ガードレール基礎
2022年2月3日



区間①迂回路
ヤード造成工
2025年2月3日



区間①上流
パンウォール工
2025年1月24日



区間③
パンウォール工
2025年1月23日




村道区間④
ガードレール工
2025年2月12日



村道1-20号線
除雪状況
2025年2月7日

3月の工事予定

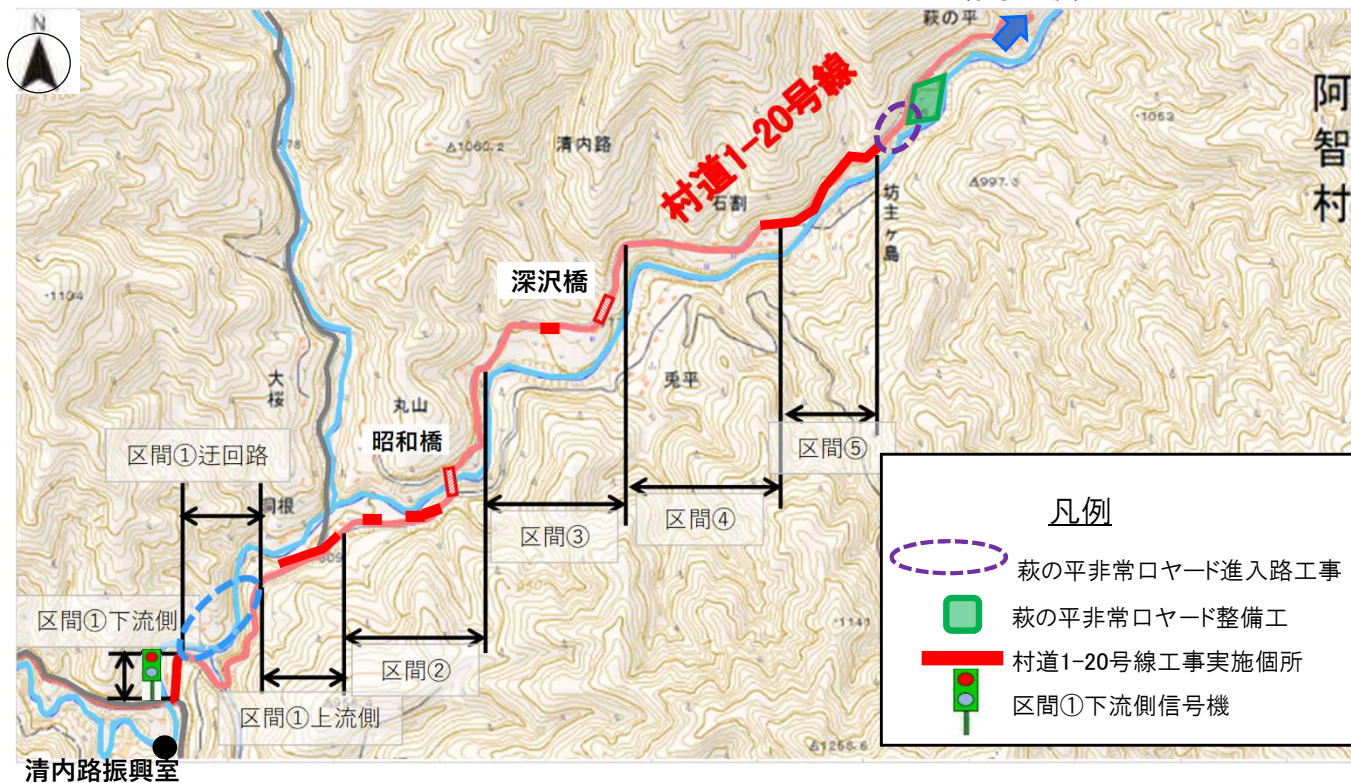

萩の平非常口ヤード整備工事は法面工、土工事、補強盛土工、萩の平非常口ヤード進入路工事は〰に示す箇所で引き続き、補強盛土工を、クララ沢進入路ではボーリング調査工を行う予定です。村道1-20号線拡幅工事は、—で示す区間①下流側で手すり撤去、シールコンクリート、区間①迂回路で仮栈橋工、区間①上流側でパンウォール工、区間②で支障移転工事、ブロック積擁壁工、パンウォール工、区間③でパンウォール工、ガードレール基礎、区間⑤で構造物撤去、ガードレール基礎を、降雪時には阿智村と協力して除雪工をする予定です。

2025年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
萩の平非常口ヤード整備工事	法面工、土工事、補強盛土工																														
萩の平非常口ヤード進入路工事	補強盛土工																														
クララ沢進入路			ボーリング調査工																												
村道1-20号線拡幅工事			【区間①下流側】手すり撤去、シールコンクリート																												
			【区間①迂回路】仮栈橋工																												
			【区間①上流側】パンウォール工、ブロック積擁壁工、ガードレール基礎																												
			【区間②】支障移転工事、パンウォール工																												
			【区間③】パンウォール工、ガードレール基礎																												
			【区間⑤】構造物撤去、ガードレール基礎																												
資材搬入車両予定台数			50~100台/日(往復)							50~100台/日(往復)							50~100台/日(往復)							50~100台/日(往復)							

※1月の資材搬入車両実績：64台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回（往路・復路）通過します。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

土曜日等の作業について

(2枚目)

現在、萩の平非常口ヤードにおいて造成工事を行っています。積雪や地盤状況により工事の進捗に影響が生じています。

つきましては、下記の通りの作業を実施させていただいております。

- ・ 2月8日より土曜日についても作業実施
- ・ 進捗等に応じて早出残業（7：00～18：30頃を予定）を実施

現時点の進捗状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
非常口ヤード造成工事												
トンネル仮設備工事												
トンネル掘削工事												
遅延日数	除雪による：計14日(1/7～1/10、1/14～17、1/29～1/30、2/4～7)、硬岩による：3日 → 最大 計17日											



積雪状況



硬岩出現状況

作業にあたっては下記の通りの安全対策を実施致します。

- ・ 村道を通行する車両は通勤の車両のみとして、**工事用車両による資機材の搬出入は行いません**。ただし重機の燃料を給油するローリー車が通行する場合があります。
- ・ 通勤の車両は可能な限り乗り合いをし、**通行車両台数の低減に努めます**。
- ・ 通勤時は洞根地区周辺までは**誘導員を配置**し、地元車両の優先に努めます。

なお、ヤード造成工事は来年度の秋ごろまでかかる見通しであり、秋ごろまでは工事の進捗に応じて土曜日作業及び早出残業を実施する可能性があります。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：菊地,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：阿部, 秋山

〔 平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。 〕
