

## 中央アルプストンネル(萩の平)だより

2023年6月 NO.34

## 作業状況

現在、萩の平ヤード進入路の土工事（切土・法面工）、坊主線で地質調査工、区間③④で水道工事、区間①下流部で仮設工事を行っています。引き続き、クレーンによる資材の荷降ろし作業等に伴い、各作業箇所周辺で**通行規制**を行います。一般車の通行は可能ですが、お待たせする事もありますのでご了承ください。

区間①上流部、区間②、区間⑤につきましては工程が決まりましたら別途ご案内いたします。



萩の平  
非常口ヤード  
令和5年5月22日



萩の平ヤード進入路  
切土工  
令和5年5月22日




石割水道工事  
ブレーカー掘削  
令和5年5月22日



深沢橋補修工事  
伸縮ジョイント工  
令和5年5月11日

## 土木工事紹介

今月は、水道工事を紹介します。



① 【カッター切断】  
舗装をカッターで切断します。



② 【舗装撤去】  
切断した舗装を撤去します。



③ 【掘削工】  
バックホウで掘削します。



④ 【基礎砂】  
基礎砂を敷均します。



⑤ 【水道管敷設】  
水道管を敷設します。



⑥ 【埋戻工】  
水道管のまわりは砂で、残りは③で掘削した土で埋戻します。




⑦ 【路盤工】  
砕石路盤を敷均し転圧します。



⑧ 【舗装工】  
As合材で舗装します。これで完成です。

裏面に続く➤

# 7月の作業予定

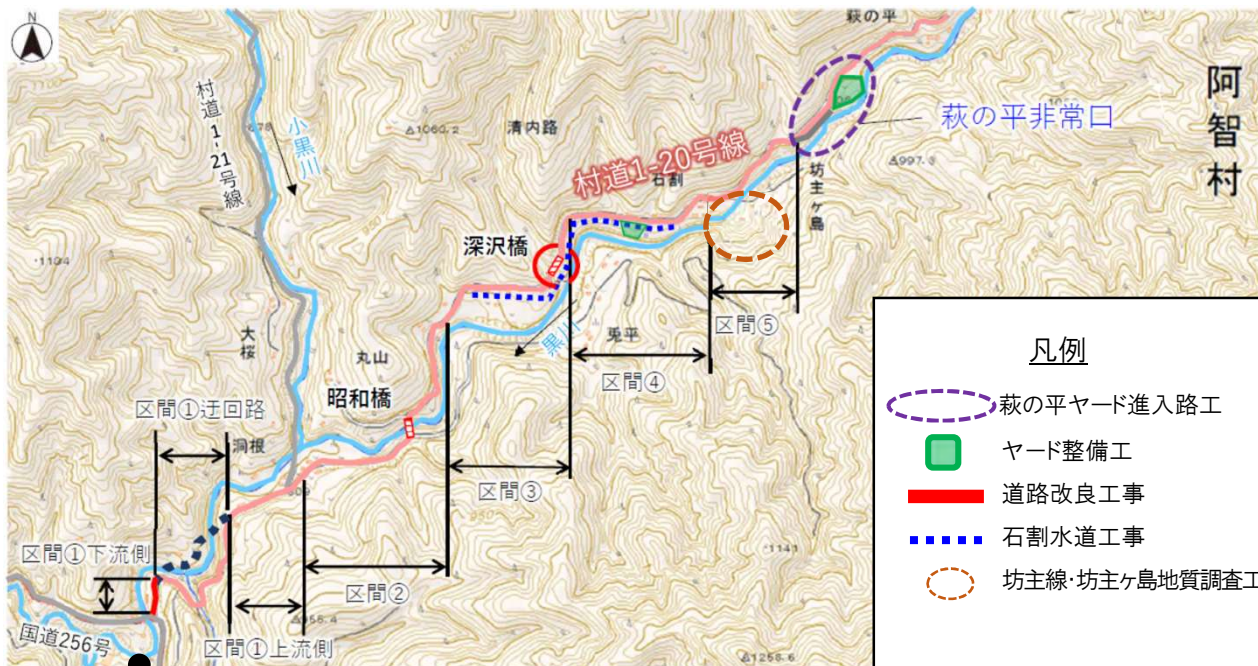

清内路振興室

萩の平ヤード進入路工は○に示す箇所で先月に引き続き、切土工・法面工を行います。  
 坊主線・坊主ヶ島地質調査工は○に示す箇所で調査ボーリングを行います。  
 .....の区間で石割水道工事は水道工事を、村道拡幅工事は準備工を施工します。  
 村道1-20号線(区間①下流)では—に示す箇所で行政手続き完了後に廃棄物撤去工に入る予定です。  
 引続き誘導員またはセンサー付信号機による通行規制を行います。ご協力をお願いします。

令和5年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
ヤード進入路工	土工(切土、法面工) ※この期間中、数日の通行規制を行います。																														
坊主線・坊主ヶ島地質調査工	調査ボーリング																														
石割水道工事	【区間③④】水道工事 ※この期間中、通行規制を行います。																														
村道1-20号線	【区間③④】準備工(予定)																														
	【区間①下流】廃棄物搬出(予定)																														
資材搬入車両 予定台数			20~40台/日 (10~20往復/日)							20~40台/日 (10~20往復/日)							20~40台/日 (10~20往復/日)							20~40台/日 (10~20往復/日)							20~40台/日

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回通過します。  
 今月も数回25tクレーンが出入りします。  
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~5時の時間帯に運搬する予定です。

## お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工事局 中津川鉄道建設所  
 〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45 TEL: 0573-67-8690  
 ※問い合わせ時間 土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時~17時 担当: 藤田, 今井, 小関

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)特定建設工事共同企業体  
 〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所 TEL: 0265-48-5736  
 ※問い合わせ時間 長期休暇(年末年始等)を除く、9時~17時 担当: 阿部, 秋山  
 ※土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。  
 清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。
