

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2023年12月 NO.40

作業状況

現在、萩の平ヤードで地質調査工、萩の平非常口ヤード進入路で土工事（切土・法面工）、村道区間④で砕石舗装工事、村道区間③で水道工事、村道区間①で廃棄物掘削・搬出を行っています。



萩の平非常口ヤード
土工事（切土・法面工）
2023年12月10日



村道区間④
砕石舗装
2023年12月5日



村道区間①下流
廃棄物土のう詰
2023年12月8日

土木工事紹介

今回は、村道拡幅工事のうち「大きな改変を要しない整地工」をご紹介します。区間④では砕石舗装を施工しています。今後アスファルト舗装するまでの期間は、砕石舗装を通行できます。



① 【着工前】



② 【舗装切断】
舗装を切断します。



③ 【掘削】
掘削します。



④ 【???】
カモシカの赤ちゃんが見物に
きました。



⑤ 【砕石投入】
砕石を投入します。



⑥ 【敷均し】
砕石を敷均します。




⑦ 【転圧】
砕石を転圧し道路の高さ
まで仕上げます。



⑧ 【砕石舗装完成】
砕石舗装完成です。今後
ほかの舗装と一緒にアス
ファルト舗装します。

1月の作業予定

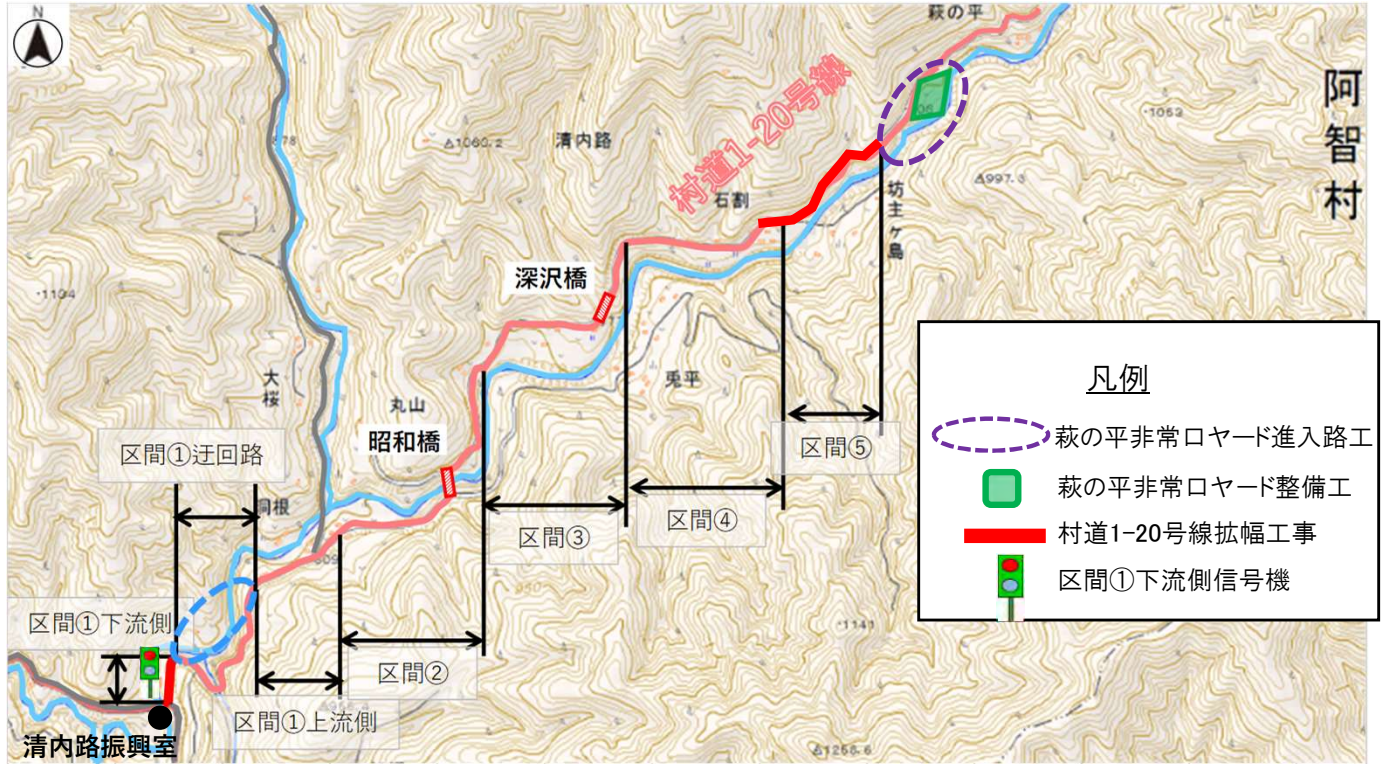

萩の平非常口ヤード進入路工は に示す箇所で引き続き、切土、法面工、地質調査工を行います。
 村道1-20号線拡幅工事は区間④⑤で準備工、区間②、区間①上流側で仮設工事、区間①下流側では に示す箇所で土工事、法面工に入る予定です。

2024年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
萩の平非常口ヤード進入路工																																
村道1-20号線拡幅工事	年末年始休暇																															
資材搬入車両予定台数																																

※年末年始休暇は2023.12.28～2024.1.8です。この期間は作業がありません。
 ※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回通過します。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する予定です。

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工事事務所 中津川鉄道建設所
 〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45 TEL: 0573-67-8690

※問い合わせ時間 土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時～17時 担当: 藤田, 今井, 小関

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体
 〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所 TEL: 0265-48-5736

※問い合わせ時間 長期休暇(年末年始等)を除く、9時～17時 担当: 阿部, 秋山

※土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。
