

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2022年3月 NO.19

作業状況

現在、ヤード進入路の土工事（切土・法面工）を行っています。土工事（切土）の発生土は、施工ヤードにダンプ運搬しています。

引続き、クレーンによる資材の荷降ろし作業を行います。それに伴い、**通行規制**を行います。一般車通行時には誘導いたします。また、お待たせする事もありますのでご了承ください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

詳細日時は、村道1-20号線にお知らせ看板を設置しますので、ご確認ください。



進入路(起点側)



萩の平ヤード

工事写真


切土（切土・法面工）

今月も引き続きバックホウで切土(写真)をして、法面にモルタルを吹き付けてから、削孔機で削孔して鉄筋棒を挿入しています。この手順で1段ずつ工事を進めていきます。



裏面に続く➡

4月の作業予定

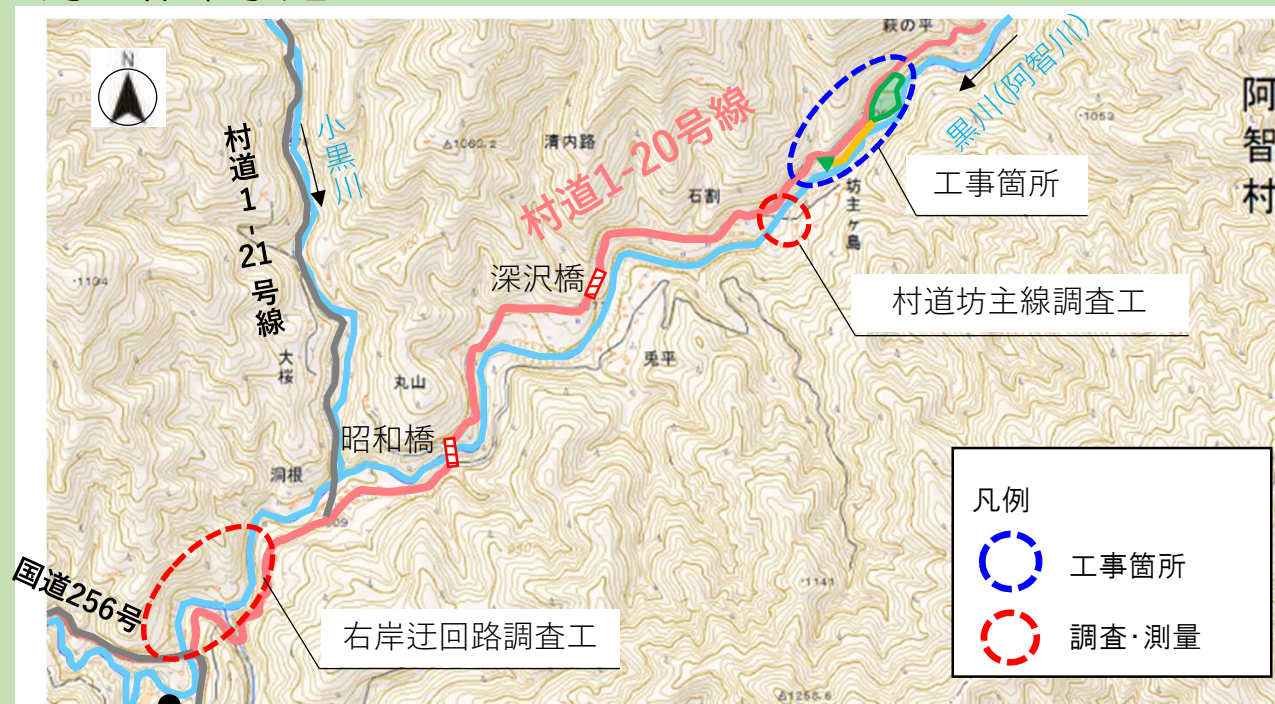

清内路振興室

ヤード進入路工は青丸：○に示す箇所で土工事を行います。また、赤丸：○に示す箇所で現地踏査・測量・樹木の根まわしに入る予定です。

令和4年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
ヤード進入路工	土工事(切土、法面工)																														
	※この期間中、数日の通行規制を行います。																														
右岸迂回路 調査工	現地踏査・測量																														
村道坊主線 調査工	現地踏査・測量																														
資材搬入車両 予定台数	8～10 台/日			8～10台/日								8～10台/日							8～10台/日						8～10台/日						

※資材搬入車両は、片道の台数です。今月も数回25tクレーンが出入りします。

問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

関東甲信工務局 中津川鉄道建設所

〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45

TEL：0573-67-8690 ※問い合わせ時間 平日 9時～17時
担当：藤田, 関谷

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル

(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体

〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所

TEL：0265-48-5736 ※問い合わせ時間 平日 9時～17時
担当：阿部, 秋山
